Nome attività	Durata
Allestimento di cantiere	22 g
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	229 g
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI	148 g
Rimozione di serramenti esterni ed interni	24 g
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	24 g
Taglio di muratura a tutto spessore	25 g
Demolizione di tompagnature	27 g
Demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di mezzi meccanici	28 g
Rimozione di pavimenti interni	26 g
Rimozione di impianti	88 g
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (centralizzato)	90 g
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio	91 g
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	87 g
Realizzazione di impianto elettrico interno	89 g
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie	30 g
Consolidamento di muratura	29 g
Impermeabilizzazione di pareti controterra	28 g
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio	29 g
Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio	20 g
Realizzazione di murature esterne	36 g
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	38 g
Formazione di massetto per pavimenti interni	22 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	32 g
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	29 g
Posa di serramenti esterni	32 g
Posa di pavimenti per interni	38 g
Posa di rivestimenti interni	34 g
Posa di serramenti interni	34 g
Tinteggiatura di superfici interne	35 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	20 g
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	15 g
Tinteggiatura di superfici esterne	15 g
Scavo a sezione obbligata	13 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	14 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	10 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	4 g
Rinterro di scavo	11 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	10 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	10 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	8 g
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	10 g
Formazione di massetto per coperture	11 g
Impermeabilizzazione di coperture	11 g
Formazione di fondazione stradale	7 g
Formazione di manto di usura e collegamento	6 g
Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro	9 g
Realizzazione di impianto ascensore	45 g
Smobilizzo del cantiere	16 g

LEGENDA Zona:

Z1 = FASE 3

Z2 = CAMERA CALDA

Z3 = PRONTO SOCCORSO - NUOVO CORPO

Z4 = PRONTO SOCCORSO

Z5 = PROSPETTI LUOGHI SICURI

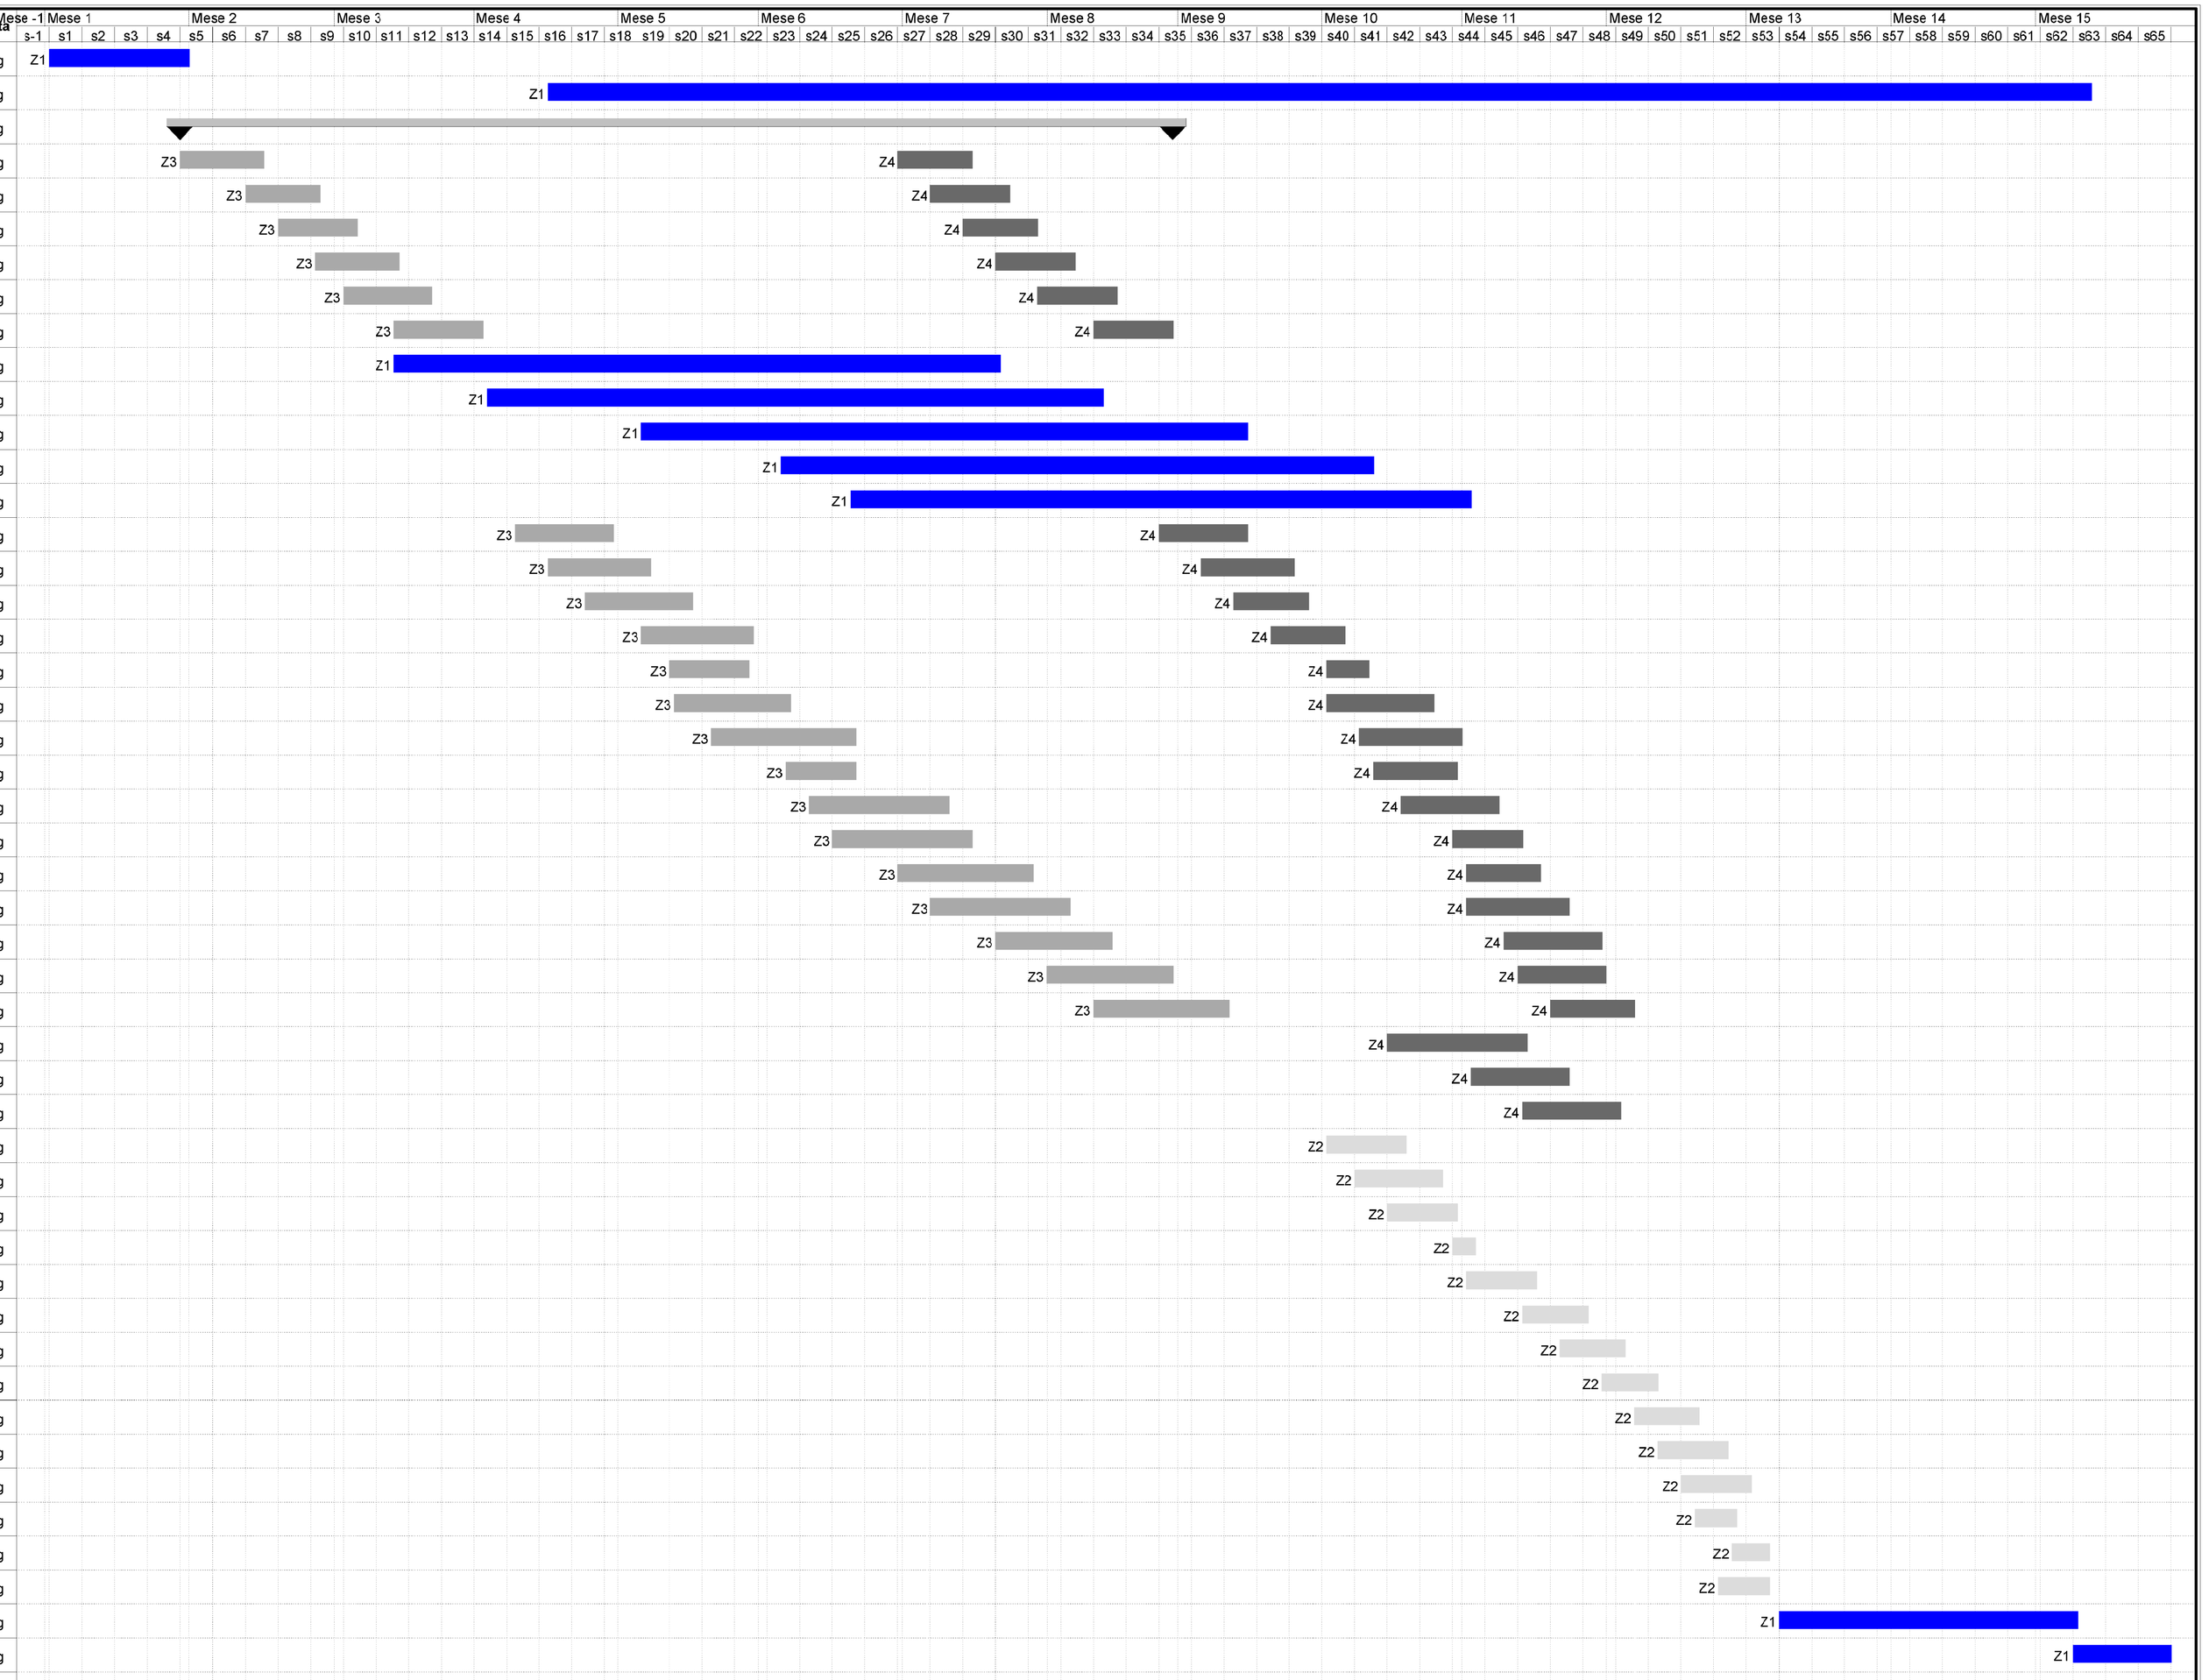

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO - VIA ENRICO FERMI, 15 - 01100 VITERBO - P. IVA 01455570562

RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'OSPEDALE DI CIVITA CASTELLANA (VT)

FASE 3: PRONTO SOCCORSO

- PROGETTO ESECUTIVO -

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
- Arch. Marco Iobbi

PROGETTAZIONE:
- Arch. Giuseppe Manara
Via del Babuino, 107 - 00187 Roma
- Ing. Vittorio Cassani
Via Muzio Clementi, 70 - 00193 Roma
- Ing. Massimo Arduini
Vial Igino Garbini, 51 - 01100 Viterbo

COORDINATORE ALLA SICUREZZA:
- Ing. Vittorio Cassani
Via Muzio Clementi, 70 - 00193 Roma

OGGETTO:
DIAGRAMMA DI GANTT
(CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI)

TAVOLA: PS_G.12a

DATA:	AGG.:	DATA	DESCRIZIONE:	SCALA:
MARZO 2012	02	09/2014		...
FILE: PS_G.12a				DATA PROGETTO: MARZO 2012
